


工 事 概 要 書

- ① 工 事 名
- (仮称) 新吉田東四丁目農園付公園下水道整備工事
- ② 工 事 場 所
- 港北区新吉田東四丁目3680番地ほか
- ③ 工 期
- 自) 令和 5年 6月 5日 ～ 至) 令和 5年12月22日
(変更: 至) 令和 6年 2月29日 地元調整に時間を要したため工期延期 施工開始9/4)
- ④ 発 注 者
- 横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課 担当者:土屋 累央
- ⑥ 施 工 者
- 株式会社直紀建設 TEL045-349-9126 FAX045-349-7922
現場代理人:安藤 健司
- ⑦ 請負金額
- ¥47,098,932-(内消費税等相当額 ¥4,281,721-)
- ⑧ 工 事 概 要
- 本工事は、(仮称) 新吉田東四丁目農園付公園の整備工事を行うものです。

⑨ 工 事 内 容

工種・規格	単位	設計数量	備 考
【下水道工事】			
内径400mm 鋼管さや管ボーリング推進	m	11.7	
推進立坑築造工	箇所	2.0	φ2,500mm 発進:2.3m 到達:14.5m
人孔築造工	箇所	2.0	発進:第1種人孔 到達:第3種人孔
【公園工事】			
施設整備工	式	1.0	管理施設撤去工, 整備工 含む
付帯工 (舗装)	式	1.0	舗装仮復旧工, 舗装復旧工 含む

施工平面図

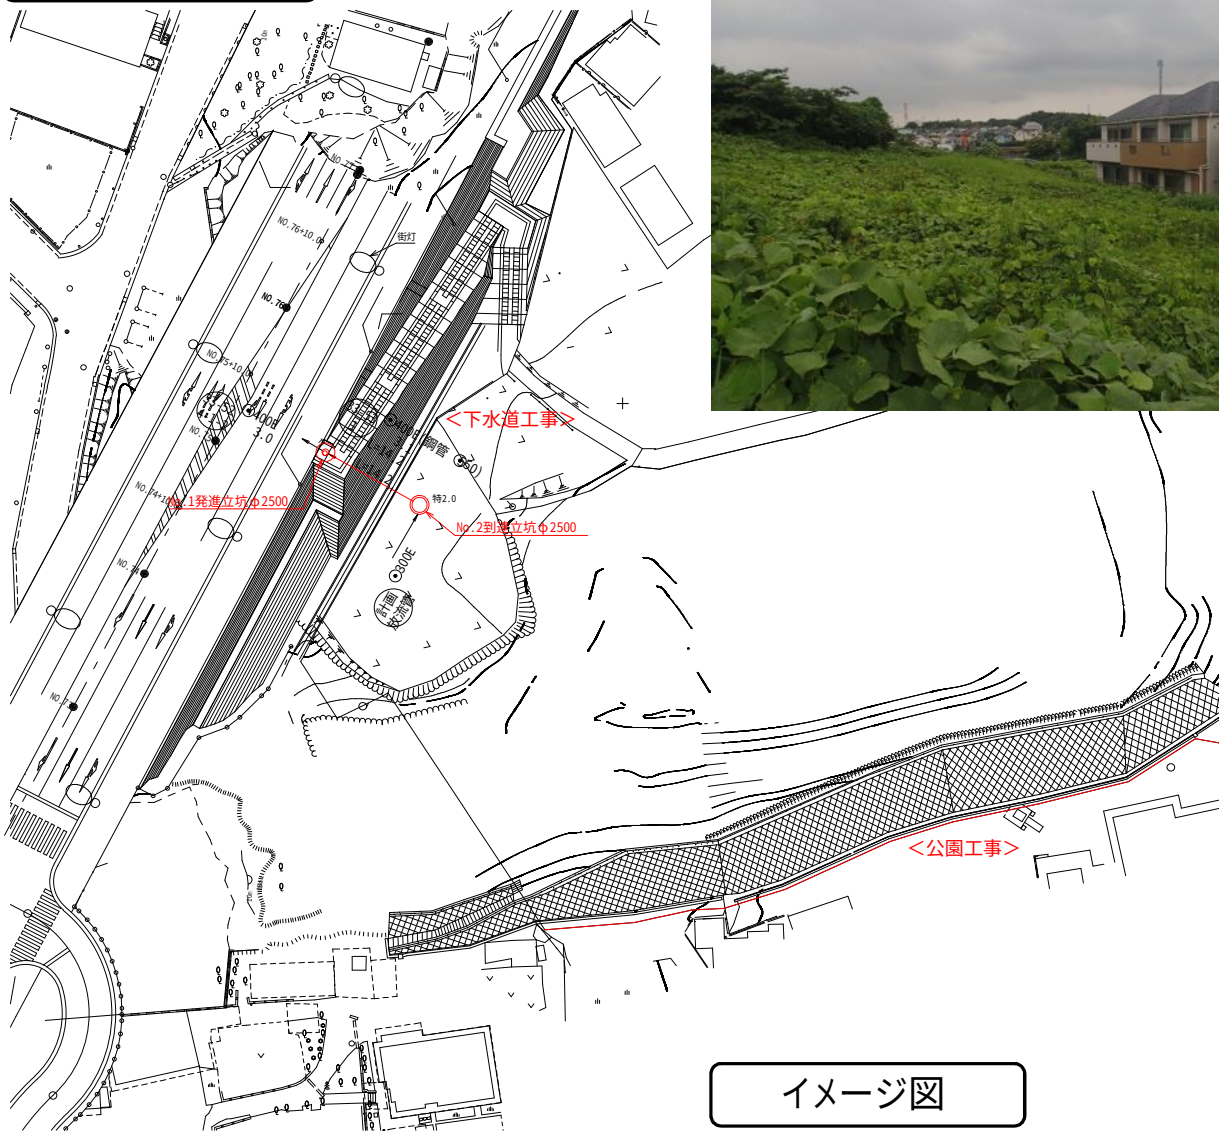

[現況写真]



イメージ図


[ライナー立坑築造状況]



[推 進 状 況]



[塩ビ管挿入状況]

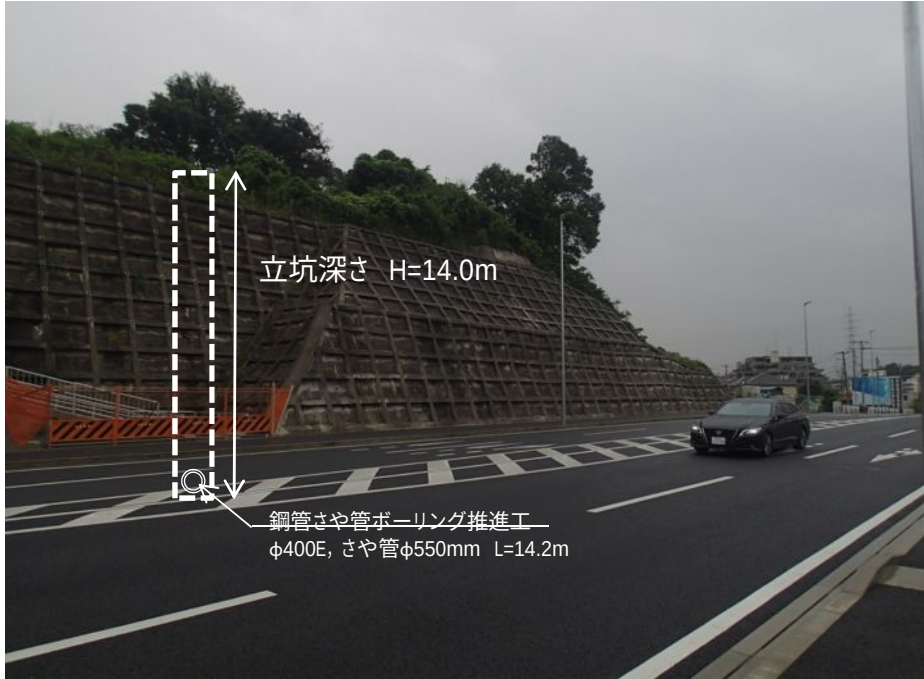

【参 考 資 料】

＜資機材 (敷き鉄板) 搬入状況＞



＜建設発生土搬出状況＞



＜資材 (組立人孔) 搬入状況＞

