

Baustellenbesichtigung

Buhnenbau Otterndorf

Nach einer verhältnismäßig kurzen Einladungszeit trafen sich 20 Kollegen am/im Baubüro der Arbeitsgemeinschaft Buhnenbau Otterndorf in Wehldorf am Deich.

Wir wurden durch die Baubevollmächtigte Frau des WSA Cuxhaven (AG) und dem Bauleiter Herrn Cris Meijer der Arbeitsgemeinschaft im Baubüro begrüßt.

Herr C. Meijer hielt einen Vortrag über die Baumaßnahme, die in den Jahren 2011 -12 im Altenbrucher Bogen und vor dem Strand in Otterndorf durchgeführt wird.

ARBEITSGEMEINSCHAFT Buhnenbau Otterndorf



Heinrich Hirdes GmbH



Colcrete von Essen
GmbH & Co. KG



Johann Bunte
GmbH & Co. KG




Van den Herik GmbH

Beauftragte Mengen


- Sinkstücke 200.000 m²
- Steine LMB 10/60 (kg) 50.000 To
(Randbereich Sinkstück)
- Steine CP 60/200 (mm) 300.000 To
(Buhnenkern)
- Steine LMB 40/300 (kg) 250.000 To
(Buhnen Deckschicht)
- Gesamt verteilt über 20 Buhnen

Geotextil zusammen Nähen

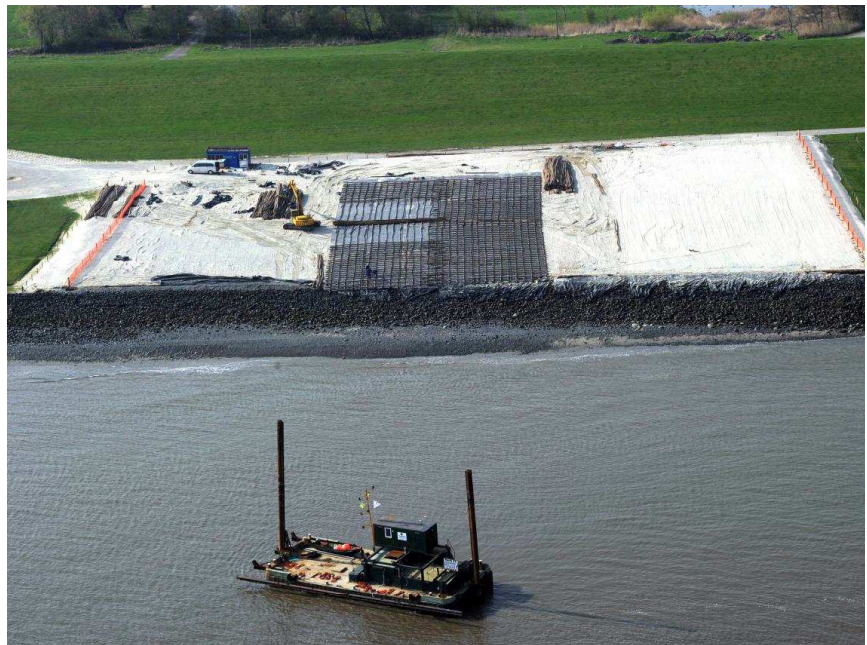


Sinkstück ins Wasser ziehen



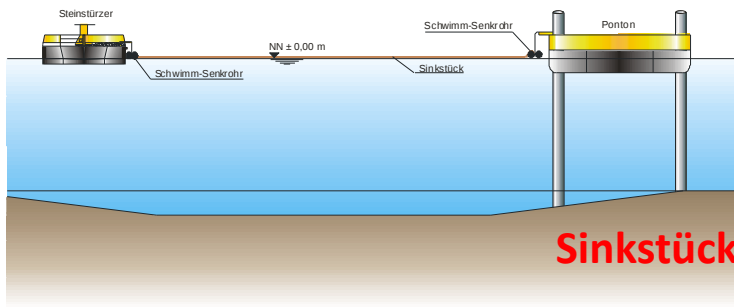

Sinkstück Positionieren

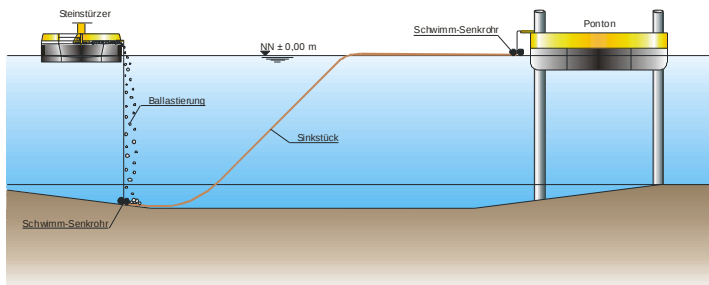


Sinkstück Absenken





Nach einer kurzen Fragestellung/Diskussion sind wir auf den Deich hinter dem Baubüro gestiegen.

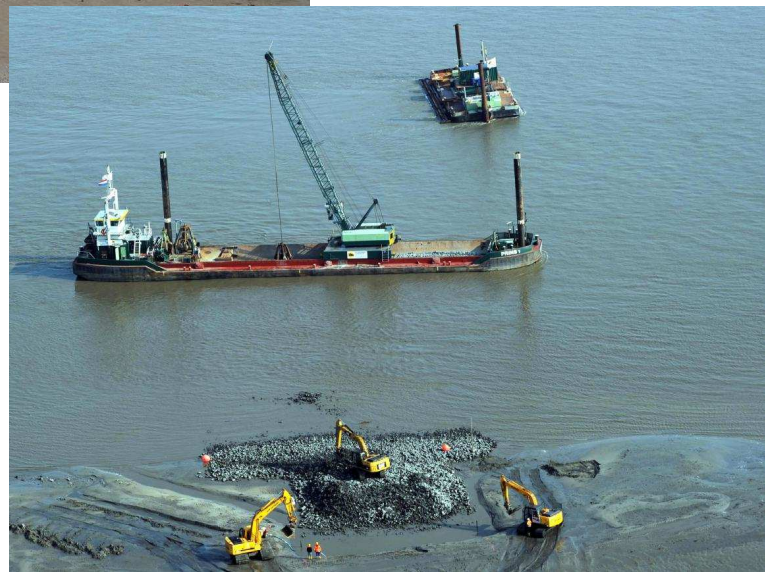

Das Datum und die Zeit der Besichtigung waren so gelegt worden ,daß es uns die Möglichkeit gab, vom Deich aus einen Einbauvorgang eines Senkstückes an einer neuen Bühne verfolgen zu können.

Zwischen einer Schute und dem Steinstürzer „Berghaus“ war das Senkstück an die Verbringestelle befördert worden. Hier wurde es dann bei Stauwasser mit dem Steinstürzer abgesenkt. D.h., das seitliche Halterohr mit dem Senkstück wurde auf den Wattgrund abgesenkt und mit Steinen vom Steinstürzer aus gegen Auftrieb abgedeckt. Die Steine werden seitlich über die Bordkante gestürzt in dem das Gerät seitlich fährt.

Hans-Jürgen Schütte

.
